




015030065R

有效期至2018年5月22日

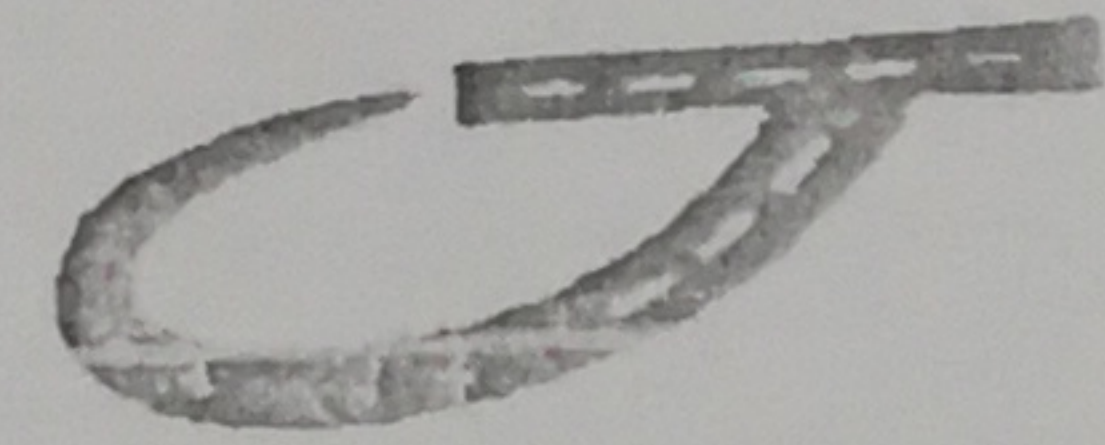

交GJC甲101

检 验 报 告

报告编号: JS20170095

工程名称: 清东陵高速公路特大桥、大桥标志牌完善工程

样品名称: 钢板

委托单位: 唐山公路建设总公司

检测类别: 委托

受检单位: 唐山公路建设总公司



唐山市交通建设试验检测中心

声 明

- 1、本检测中心的检测报告正本应盖有“唐山市交通建设试验检测中心试验专用章”，“骑缝章”否则视为无效；
- 2、复制报告未重新加盖“唐山市交通建设试验检测中心试验专用章”无效；
- 3、报告无试验人、审核人、批准人签名无效；
- 4、报告涂改无效，部分提供或部分复印检测报告无效；
- 5、对本检测报告若有异议，请于收到报告之日起 15 日内向本中心提出，逾期则不予受理；
- 6、对送样检测，仅对来样的检测数据负责，不对来样所代表的批量负责。
- 7、见证人、见证单位信息由委托方提供，本中心不对其真实性负责。

地 址：唐山市路北区果园乡李官屯村路北承唐高速管理处院内

邮政编码：063000

电 话：0315——2200882

传 真：0315——2200861

Email 地址：syjczx@126.com

唐山市交通建设试验检测中心

检验报告

报告编号: JS20170095

共 2 页第 1 页

委托单位	唐山公路建设总公司		
工程名称	清东陵高速公路特大桥、大桥标志牌完善工程		
检验类别	委托	送样人	薄澜
样品编号	JS20170001	/	/
样品名称	钢板	/	/
规格/牌号/设计强度	6x4x2m ²	/	/
厂家/产地	河北敬业钢构科技有限公司	/	
出厂日期	/		/
出厂编号/质保单号/批号	/	/	/
现场桩号/检测部位	标志支座	/	/
取样/成型日期	/	/	/
取样地点	厂家	/	
样本数量	12m ²	/	/
样品描述	表面微锈, 无裂纹。	/	/
代表数量/总数量	/	/	/
检测项目	金属材料拉伸试验		
环境温度与湿度	20℃/26%		
检测依据/综合判定原则	GB/T3274-2007、GB/T23827-2009		
主要仪器设备	微机控制伺服万能试验机 (A-0110)		
见证单位	河北保神工程监理有限公司	见证人	范向震
取样单位	/	取样人	/
委托日期	2017-04-10	检测日期	2017-04-10-2017-04-13
检测结论	经按《道路交通标志及支撑标》(GB/T23827-2009)标准评定, 该样品所测项目试验结果符合标准要求。 (盖章) 签发日期: 2017年4月10日		
备注	/		

试验人: 李

审核人: 王

批准人: 李

检验报告

(金属材料拉伸)

报告编号: JS20170095

共 2 页第 2 页

样品编号	检测项目	计量单位	技术要求	检测结果		单件判定	备注
2017JS0001	试件厚度或直径	mm	/	1	20	/	/
				/	/	/	
				2	20	/	
	上屈服强度	MPa	/	1	/	/	/
				/	/	/	
				2	/	/	
	下屈服强度	MPa	≥ 245	1	262	合格	/
				/	/	/	
				2	288	合格	
	抗拉强度	MPa	410~530	1	419	合格	/
				/	/	/	
				2	429	合格	
	最大力总延伸率	%	/	1	/	/	/
				/	/	/	
				2	/	/	
	断裂总伸长率	%	/	1	/	/	/
				/	/	/	
				2	/	/	
	断后伸长率	%	≥ 20	1	29	合格	/
				/	/	/	
				2	25	合格	
	断面收缩率	%	/	1	/	/	/
				/	/	/	
				2	/	/	
	抗震系数	/	/	1	/	/	/
				/	/	/	
				2	/	/	
	断口形式	/	/	1	延性断裂	/	/
				/	/	/	
				2	延性断裂	/	
	试验结果	/	/	/	/	/	/
